

PROJEKTBEKRIVELSE

Demonstrationsprojekt

DATO: 17. april 2022

ANSØGT AF: Kalundborg
Kommune

SAGSNR: 2022-9

Projektinformation

Projekt navn: Sæby

Lokalitet adresse: Sæbyvej - Gørlevvej

Ejendomsnummer:

Lokalitet matrikel: 11v, Sæby by, Sæby

Areal: 10,8 hektar

Areal af fredskov: 6,2 hektar

Forventet tidspunkt for tilplantning af skoven: Forår 2024

Dato: 14-09-2023

Projektbeskrivelse vedr. skovrejsning Kalundborg kommune

Kalundborg kommune & HedeDanmark sender her projektbeskrivelsen* på skovrejsningsprojektet ved Sæby.

**) Beskrivelsen skal ses i forlængelse af tidligere fremsendt ansøgning af 25. februar 2022 fra Kalundborg Kommune (Klimaskovfondens kommunale demonstrationsprojekter) med deraf følgende tilsagnsskrivelse fra Klimaskovfonden i 20. april 2022/revideret 17. august 2022.*

Kontaktpersoner:

Kalundborg kommune: Susanne Boesen, 2938 7848, subo@kalundborg.dk

HedeDanmark: Christian Ritz-Andersen, 2122 7791, cra@hededanmark.dk

Overordnet målsætning med skovrejsningsprojektet

Målet er at få skabt en klimatilpasset, robust og naturnær skov, der kan opnå høj CO₂-binding (klimaeffekt) og derved bidrage til opfyldelse af kommunens klimamål. Med sine forskellige skovtyper, en nyetableret sø og rekreative anlæg, vil den bynære skov være et aktiv for Sæby, som et rekreativt område for landsbyens borgere, skole og daginstitution. Sidst men ikke mindst vil skoven bidrage til øget biodiversitet, som et godt levested for dyr og planter.

Nuværende og historisk arealbeskrivelse:

Projektarealet er beliggende i tilknytning til landsbyen Sæby, der ligger naturskønt i den sydøstlige del af kommunen tæt på Tissø, Naturpark Åmosen og naturbeskyttelsesområder (Natura 2000). Kalundborg Kommune ejer arealet, der indtil 2018 var bortforpagtet til landmand og dyrket. Arealet henligger i dag som slået græsmark.

Mod nord grænser projektarealet op til en kommunal boldbane og til boligområder med villaveje. Mod øst ligger arealet op langs hovedvejen til Høng, mod vest er dyrkede landbrugsarealer med en enkelt landejendom grænsende op til skel. Mod syd grænser arealet op til åbent land med spredt bebyggelse og landbrugsarealer. Arealet er lettere kuperet og i det sydvestlige hjørne findes et §3 moseområde. Der findes enkelte spor/trampestier i området i dag, men ingen egentlige stisystemer.

Lokalitetsbeskrivelse

Sandblandet lerjord jf. arealinformation. Arealet er stenet og der er meget terræn og dermed variation mellem våd lavning og tørre bakker.

Gennemgang af myndighedstilladelse

Projektet er blevet screenet jf. Miljøvurderingsloven og skovrejsningen anmeldt til Kalundborg Kommune i 2022.

Den 14. september 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen *Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 – Skovrejsning mv. ved Sæby*. Området ændrede derved anvendelse fra boligformål til offentligt, rekreativt formål som blandt andet skovrejsning, sø og

opholdsarealer med rekreative faciliteter. Samtidig blev arealet ført tilbage fra byzone til landzone.

Der er i 2023 indhentet landzonetilladelser til henholdsvis udgravning af ny sø med 'kriblekrable-bro' samt etablering af bålhytte/shelter.

Tilplantningsplan & kulturmodeller

Se vedhæftningerne. På kortbilaget er indtegnet detaljer som hegnslinje, spor, opdeling mellem skovbryn og kerneskov, skovtyper mv.

Etableringsforløb

Arealet GPS-afsættes efterår 2023. Der pløjes og harves nu. Kulturhegnet sættes over vinteren. Til foråret harves arealet. Tilplantningen sker i april-maj 2024. Efter plantning renholdes skoven mekanisk mellem planterækker de første tre vækstsæsoner. Dog fortages ingen renholdelse på afdeling 1e, da det laves ekstensivt.

Pleje & driftsplan

Der er generelt hjemmehørende arter og det er tilstræbt at benytte arter som passer i de enkelte litra, da arealet er stærk varieret og kuperet. Artsvalget er meget varieret for at skabe en spændende skov for brugerne, men der anvendes hovedtræsarter til at sikre et effektivt CO₂-optag. Op til 30% driftes som urørt skov og op til 10% driftes som græsningsskov.

Skovbrynene: plejes for at bevare de lavere arter, så de ikke skygges og med tiden uddør helt. Det ønsker vi ikke, da de lave arter skal give bundlæ i skoven og være med til at skabe variation i grænselandet mellem skov og åbent landskab – altså der hvor der er mulighed for høj biodiversitet. Formål: bevare artsrigdommen om muligt og skabe bundlæ i kerneskov.

Kerneskovene 1b, c, d & 2a: da det samlede projekt udgør en mindre skov, er det ikke realistisk med individuel drift af de enkelte litra i kerneskovene, hvorfor skoven efter endt renholdelse overgår til en pleje ved plukhugst. Det forventes at arealerne og skovtyperne udvikler sig ret forskelligt (grundet diversitet af artsvalg, jordbund og terræn), men inden for de første 10 år er fokus især på de hurtigvoksende arter som kommer til at hæmme de langsomvoksende arter. Enten fjernes de hurtigvoksende arter, ellers bliver det i en kombination med opstamning. Der tyndes for de blivende træer i skoven for at sikre deres trivsel. Det afskårne ved efterlades i skovbunden. Formål: skabe gode forhold for de blivende træer/buske og bevare diversiteten.

Plantezonerne: tilplanter med lavere arter som hyld, dunet gedeblad, fjeldrøbe, gråpil og hassel. Plantezonerne tyndes ikke, men der kan foretages en beskæring eller stævning i zoner, hvis arterne bliver for åbne i bunden. Formål: holde buskene sunde og skabe plads til de enkelte arter.

I perioden fra 10. til 20. år forventes en tynding for at reducere stamtallet og for at optimere CO₂-optaget ved øget tilvækst på fremtidstræerne. Denne tynding vil også udføres som plukhugst, og der tyndes for de blivende træer i skoven. Piskere fjernes. Hvis der opstår lysbrønde, bevares de, men grundet skovens størrelse, laves de ikke bevidst.

Det må formodes at planen tilrettes over årene, da tilvæksten og de enkelte arters trivsel på arealet først kendes med tiden.

Ejendom: 21614 CRA diverse ejendomme

24-11-2023

Skov: Sæbyvej 19A, 4270 Høng

Plantebestilling

Akt Type	Afd litra	litra areal	Akt nr	Areal ha	Sta tus	Udføres md år	Antal	Bemærkninger
N NYK P								
		236.579		0,04	S	4 2024	SR Øerne 2022	6 rækker 1,5x1,5m
	3 4	0,04					Avnbøg II 25 stk	
							Fuglekirsebær 50 stk	
							Naur II 25 stk	
							Vildæble II 25 stk	
							Alm. hyld 50 stk	
							Gedeblad, dunet 50 stk	
							225	
		238.871		0,10	S	4 2024	SR Individuelt 2022	1,5x1,5
	0 1	0,10					Gedeblad, dunet 175 stk	
							Fjeldribs 100 stk	
							Alm. hyld 175 stk	
							450	
		231.698		1,59		6 2024	SR Individuelt 2022	Skovrejsning med tilskud (Klimaskovfonden) Rækkeafstand: 1,5m Planteafstand: 1,8m
	1 a	1,59					Eg, stilk I 700 stk	
							Spidsløn I 700 stk	
							Hassel I 500 stk	
							Hvidtjørn II 500 stk	
							Alm. hyld 525 stk	
							Alm. røn I 750 stk	
							Kvalkved I 300 stk	
							Benved I 300 stk	
							Vildæble I 500 stk	
							Fuglekirsebær 800 stk	
							Hæg, alm III 300 stk	
							5 875	
		231.699		0,79		6 2024	SR Individuelt 2022	Elm skal være skovelm Kvalkved og tjørn sættes i holme: 1 med alle kvalkved og en med alle tjørn. Rækkeafstand: 1,5m Planteafstand: 1,57m
	1 b	0,79					Eg, stilk I 800 stk	
							Ask I 200 stk	
							Spidsløn I 300 stk	
							Fuglekirsebær 650 stk	
							Skovfyr 200 stk	
							Avnbøg I 325 stk	
							Hassel I 50 stk	
							Elm 50 stk	
							Naur I 50 stk	
							Kornel, rød 50 stk	
							Gedeblad, dunet I 50 stk	
							Benved I 50 stk	
							Pil, selje I 50 stk	
							Kvalkved I 50 stk	
							Hvidtjørn II 50 stk	
							2 925	

Ejendom: 21614 CRA diverse ejendomme

24-11-2023

Skov: Sæbyvej 19A, 4270 Høng

Plantebestilling

Akt Type	Afd litra	litra areal	Akt nr	Areal ha	Sta tus	Udføres md	år	Antal	Bemærkninger
		231.700		2,05		6	2024	SR Individuelt 2022	Rækkeafstand: 1,5m Planteafstand: 1,57m
	1 c	2,05			Hvidtjørn II			100 stk	Skovfyr plantes i en holm.
					Eg, stilk I			2 000 stk	
					Eg, vinter I			1 700 stk	
					Ask I			100 stk	
					Avnbøg I			600 stk	
					Skovfyr			850 stk	
					Naur I			100 stk	
					Birk, dun I			1 000 stk	
					Spidsløn I			500 stk	
					Benved I			50 stk	
					Gedeblad, dunet I			500 stk	
					Hassel I			50 stk	
					Kornel, rød			50 stk	
								7 600	
		231.701		0,68		6	2024	SR Individuelt 2022	Rækkeafstand: 1,5m Planteafstand: 1,57m
	1 d	0,68			Bøg I			225 stk	Skovfyr sættes i en gruppe og seljepil sættes i en gruppe.
					Ask I			100 stk	
					Lind, småbladet I			400 stk	
					Fuglekirsebær			800 stk	
					Spidsløn I			350 stk	
					Lærk, hybrid II			200 stk	
					Fjeldribs			100 stk	
					Skovfyr			100 stk	
					Pil, selje I			100 stk	
								2 375	
		231.714		0,44		6	2024	SR Individuelt 2022	1,5x1,5m
	2 a	0,54			Eg, stilk I			1 000 stk	
					Skovfyr			200 stk	
					Alm. røn I			600 stk	
					Pil, selje I			200 stk	
					Hassel I			200 stk	
					Gedeblad, dunet I			200 stk	
								2 400	
		231.878		0,14		6	2024	SR Individuelt 2022	Ekstensiv
	1 e	0,44			Gedeblad, dunet I			100 stk	
					Hvidtjørn II			100 stk	
					Eg, stilk I			100 stk	
					Skovfyr			100 stk	
					Hassel I			100 stk	
								500	
		231.879		0,00		6	2024	SR Individuelt 2022	

Ejendom: 21614 CRA diverse ejendomme

24-11-2023

Skov: Sæbyvej 19A, 4270 Høng

Plantebestilling

Akt Type	Afd litra	litra areal	Akt nr	Areal ha	Sta tus	Udføres md år	Antal	Bemærkninger
					Spidsløn I		stk	
					Hassel I		stk	
					Hvidtjørn II		stk	
					Alm. hyld		stk	
					Hæg, alm III		stk	
					Alm. røn I		stk	
					Kvalkved I		stk	
					Benved I		stk	
					Vildæble I		stk	
							0	
		231.880		0,00		6 2024	SR Individuelt 2022	Elm skal være skovelm Kvalkved og tjørn sættes i holme: 1 med alle kvalkved og en med alle tjørn.
					Eg, stilk I		stk	
					Ask I		stk	
					Spidsløn I		stk	
					Fuglekirsebær		stk	
					Skovfyr		stk	
					Avnbøg I		stk	
					Hassel I		stk	
					Elm		stk	
					Naur I		stk	
					Kornel, rød		stk	
					Gedeblad, dunet I		stk	
					Benved I		stk	
					Pil, selje I		stk	
					Kvalkved I		stk	
					Hvidtjørn II		stk	
							0	

Ejendom: 21614 CRA diverse ejendomme

24-11-2023

Skov: Sæbyvej 19A, 4270 Høng

Plantebestilling

Akt Type	Afd litra	litra areal	Akt nr	Areal ha	Sta tus	Udføres md år	Antal	Bemærkninger
-------------	--------------	----------------	-----------	-------------	------------	------------------	-------	--------------

Overblik over Kulturmodeller for Klimaskovfondens skovrejsningsprojekter



De angivne rammer for de enkelte kulturmodeller, skal ses i sammenhæng med KSF's rammer og retningslinjer for skovrejsning (bilag 2), som beskriver de generelle kriterier for skovrejsningsprojekter, der kan støttes.

Kulturmodel 2	Kan anvendes på			Art	Indblandingspct. Interval
	Høj	Middel	Lav		
Skovbryn (Middel/Høj)	x	x			
Træart 1:				EG	20-40%
Træart 2:				LØV - valgfri	10-30%
Træart 3:				Småtræer	10-30%
Træart 4:				Buske	20-40%
Træart 5:					
Hjælpetræart 1:				Valgfri	0-20%
Hjælpetræart 2:					
I alt:					

Bemærkning: Skovbryn afd. 1A
Plantetal: 2.500pl/ha
Eg, fuglekirsebær, spidsløn
Vildæble, hassel, hvidtjørn, alm. hæg, alm. røn
Alm. hyl, kvalkved, benved,

Kulturmodel 4	Kan anvendes på			Art	Indblandingspct. Interval
	Høj	Middel	Lav		
EG/ALØ	x	x			
Træart 1:				EG	40-60%
Træart 2:				LØV - valgfri	20-40%
Træart 3:				NÅL - valgfri	0 - 10%
Træart 4:					
Træart 5:					
Hjælpetræart 1:				Valgfri	0-20%
Hjælpetræart 2:					
I alt:					

Bemærkning: Afd. 1c
Plantetal: 2.500pl/ha
Eg - både vinter og stillet
Hvidtjørn, ask, avnbøg, navr, birk, spidsløn, benved, d. gedeblad, hassel, rød kornel
Skovfyr

Kulturmodel 10	Kan anvendes på			Art	Indblandingspct. Interval
	Høj	Middel	Lav		
ALØ	x	x			
Træart 1:				ALØ	50-70%
Træart 2:				LØV - valgfri	30-50%
Træart 3:				NÅL - Valgfri	0-10%
Træart 4:					
Træart 5:					
Hjælpetræart 1:					
Hjælpetræart 2:					
I alt:					

Bemærkning: Afd. 1d
Plantetal: 2.500pl/ha
Bøg, lind, fuglekirsebær, løn,
Ask, fjeldrøbe, seljepil
Skovfyr, lærk

Kulturmodel 4	Kan anvendes på			Art	Indblandingspct. Interval
	Høj	Middel	Lav		
EG/ALØ	x	x			
Træart 1:				EG	40-60%
Træart 2:				LØV - valgfri	20-40%
Træart 3:				NÅL - valgfri	0 - 10%
Træart 4:					
Træart 5:					
Hjælpetræart 1:				Valgfri	0-20%
Hjælpetræart 2:					
I alt:					

Bemærkning: Afd. 2a
Plantetal: 2.500pl/ha
Eg
Alm. røn, seljepl, hassel, d. gedeblad
Skovfyr

Kulturmodel 10	Kan anvendes på			Art	Indblandingspct. Interval
	Høj	Middel	Lav		
ALØ	x	x			
Træart 1:				ALØ	50-70%
Træart 2:				LØV - valgfri	30-50%
Træart 3:				NÅL - Valgfri	0-10%
Træart 4:					
Træart 5:					
Hjælpetræart 1:					
Hjælpetræart 2:					
I alt:					

Bemærkning: Afd. 3 - de to plantezoner
Plantetal: 2.500pl/ha
Hassel, gråpil
Alm. hyl, d. gedeblad, fjeldribs

Kulturmodel 20	Kan anvendes på			Art	Indblandingspct. Interval
	Høj	Middel	Lav		
Naturlig tilgroning/Urørt	x	x	x		
Træart 1:				Naturlig succesion	0-100%
Træart 2:				LØV - hjemmehørende	0 - 30%
Træart 3:					
Træart 4:					
Træart 5:					
Amme-/sportræ/forkultur 1:					
Amme-/sportræ/forkultur 2:					
I alt:					0%

Bemærkning: Afd. 1b - urørt skov efter renholdelsen
Plantetal: 2.500pl/ha
Ja
Eg, ask, løn, fuglekirsebær, skovfyr, avnbøg, hassel, elm, naur, rød kornel, d. gendeblad, benved, seljepl, kvalkved, hvidtjørn

Kulturmodel 20	Kan anvendes på			Art	Indblandingspct. Interval
	Høj	Middel	Lav		
Naturlig tilgroning/Urørt	x	x	x		
Træart 1:				Naturlig succesion	0-100%
Træart 2:				LØV - hjemmehørende	0 - 30%
Træart 3:					
Træart 4:					
Træart 5:					
Amme-/sportræ/forkultur 1:					
Amme-/sportræ/forkultur 2:					
I alt:					0%

Bemærkning: Afd. 1e - ekstensiv/græsningsskov. Gruppevis tilplantning
Plantetal: 1.000pl/ha
Ja
Hvidtjørn, d. gendeblad, eg, skovfyr, hassel

Additionalitet, permanens og lækage

Additionalitet

Projektet er ikke påkrævet af gældende love, regler eller afgørelser og modtager ikke andet tilskud eller støtte til selve skovrejsningen, fra andre tilskudsordninger, andre offentlige eller private fonde og puljer eller virksomheder. Projektet kan ikke regnes som den mest rentable arealudnyttelse i forhold til alternativ arealudnyttelse og er ikke omfattet af Klimaskovfondens retningslinjer for gængs praksis.

✓ Det bekræftes, at ovenstående fortsat er gældende

Permanens

For at sikre permanens pålægges fredskovspligt og en tidsbegrænset servitut på projektarealet.

✓ Det bekræftes, at ovenstående fortsat er gældende

Lækage

Projektgennemførslen giver ikke anledning til, at den tidligere produktion eller brug af arealet flytter til andre arealer, der er kontrolleret af ansøger.

✓ Det bekræftes, at ovenstående fortsat er gældende

Validering, verificering og monitorering af projektet

Støttemodtagere eller nye lodsejere skal i hele projektperioden på anmodning fra fonden afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for støtten fortsat opfyldes. Støttemodtagere eller nye lodsejere skal i hele projektperioden underrette fonden, hvis betingelserne for støtten ikke længere opfyldes.

I tråd med international praksis i det frivillige CO₂-marked gennemføres der herudover kontrol (validering og verifikation) af alle projekter støttet af Klimaskovfonden.

Validering har til formål at validere, at projektet er gennemført i tråd med det, der er givet endeligt tilsagn til. Projektet valideres både af Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart. Klimaskovfondens validering ligger forud for den uafhængige tredjepartsvalidering og er altid fysisk på arealet. Tredjepartsvalideringen kan både være skrivebordsvalidering og fysisk validering.

Verifikation sker løbende med henblik på at verificere opnåelsen af projektets forventede kulstofeffekter og eventuelle synergieffekter. Den første verifikation sker senest 3 1/2 år efter, at projektet er anlagt. På den første verifikation tjekkes blandt andet træernes sundhed, eventuel opfølgning på påbud fra valideringen, hegnets tilstand, og om der er spor efter sprøjtning og gødskning. Projektet verificeres både af Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart. Klimaskovfondens verifikation ligger forud for den uafhængige tredjepartsverifikation og vil som oftest være fysisk kontrol på arealet. Tredjepartsverifikationen kan både være skrivebordsverifikation og fysisk verifikation.

Klimaskovfonden afholder alle direkte omkostninger relateret til den uafhængige validering og verifikation.

KLIMASKOV
FONDEN

Modelversion: Version 2.0, marts 2024

Plan udarbejdet:

Overordnet arealfordeling:	Bevokset: 100%	Ubevokset: 0%
Fordeling - løv/nål på bevokset areal:	Løv: 100%	Nål: 0%
Andel hjemmehørende:	94%	

							Langsigtet varig CO2-binding (før fradrag for buffer)							
							Tons CO ₂ æk pr. ha				Tons CO ₂ æk ialt			
Afd.	Litra	Areal (ha)	Projekt - arealanvendelse (additionalitet)	Etablering år	Bevoks.-pct.	Kulturmodel	Jordbund	Dødt ved og litter	Levende biomasse (stamme, grene, rødder)	Binding pr. ha samlet	Jordbund	Dødt ved og litter	Levende biomasse (stamme, grene, rødder)	Binding i alt
1	a	1,6	Ny skov og natur	2024	100%	Skovbryn (Høj)	77	54	232	363	122	86	369	577
1	b	0,8	Ny skov og natur	2024	100%	Naturlig tilgroning/Urørt (Høj)	77	54	479	610	61	43	378	482
1	c	2,1	Ny skov og natur	2024	100%	EG/ALØ (Høj)	77	54	281	412	158	111	576	845
1	d	0,7	Ny skov og natur	2024	100%	ANDET LØV (Høj)	77	54	193	324	52	37	131	220
1	e	0,4	Ny skov og natur	2024	100%	Skovbryn (Høj)	77	54	232	363	34	24	102	160
2	a	0,5	Ny skov og natur	2024	100%	EG/ALØ (Høj)	77	54	281	412	39	27	141	206
3	4	0,0	Ny skov og natur	2024	100%	ANDET LØV (Høj)	77	54	193	324	3	2	8	13
3	1	0,1	Ny skov og natur	2024	100%	Skovbryn (Middel)	77	54	216	347	8	5	22	35
I alt		6,2					77	54	279	410	477	334	1.726	2.537
Heraf - ny skov og natur:		6,2					77	54	279	410	477	334	1.726	2.537

Resultat af CO₂-beregning - sammendrag:



Modelversion: Version 2.0, marts 2024


Plan udarbejdet:

Projekt - Kvitteringsnummer:	2022-9
Ansøgningsrunde:	Ansøgningsrunde 1, 2022
Projekt navn:	Sæby
Areal (ha):	6
Startår for projekt:	2024

Varig additional CO ₂ -binding - i alt (t CO ₂ æk) - (før fradrag for buffer)	2.537
Varig additional CO ₂ -binding, gns. pr. ha (t CO ₂ æk/ha) - (før fradrag for buffer)	409
Varig additional CO ₂ -binding - i alt (t CO ₂ æk) - (efter fradrag for buffer)	2.157
Varig additional CO ₂ -binding, gns. pr. ha (t CO ₂ æk/ha) - (efter fradrag for buffer)	348
Aldersinterval hvor varig binding opnås (år):	71-75

Forventet varig CO ₂ -binding, der skal indtastes i ansøgning (t CO ₂ æk):	2.157
--	-------

Projekteret CO ₂ effekter i 5 års perioderne				
Projekt periode:	CO ₂ effekt i perioden - ny skov efter buffer er fratrasket	CO ₂ effekt til buffer pulje i 5 års intervaller	CO ₂ effekt i perioden, - ny skov efter buffer er fra trukket (per ha)	Buffer i perioden (per ha)
0-5	33	6	5	1
6-10	97	17	16	3
11-15	178	31	29	5
16-20	225	40	36	6
21-25	220	39	35	6
26-30	248	44	40	7
31-35	205	36	33	6
36-40	122	22	20	3
41-45	123	22	20	4
46-50	130	23	21	4
51-55	114	20	18	3
56-60	111	20	18	3
61-65	123	22	20	3
66-70	139	25	22	4
71-75	91	16	15	3
76-80	-11	-2	-2	0
81-85	-4	-1	-1	0
86-90	127	22	20	4
91-95	125	22	20	4
96-100	149	26	24	4
GNS per år fra år 0-100	25	4	4	1
sum	2.547	449	411	72

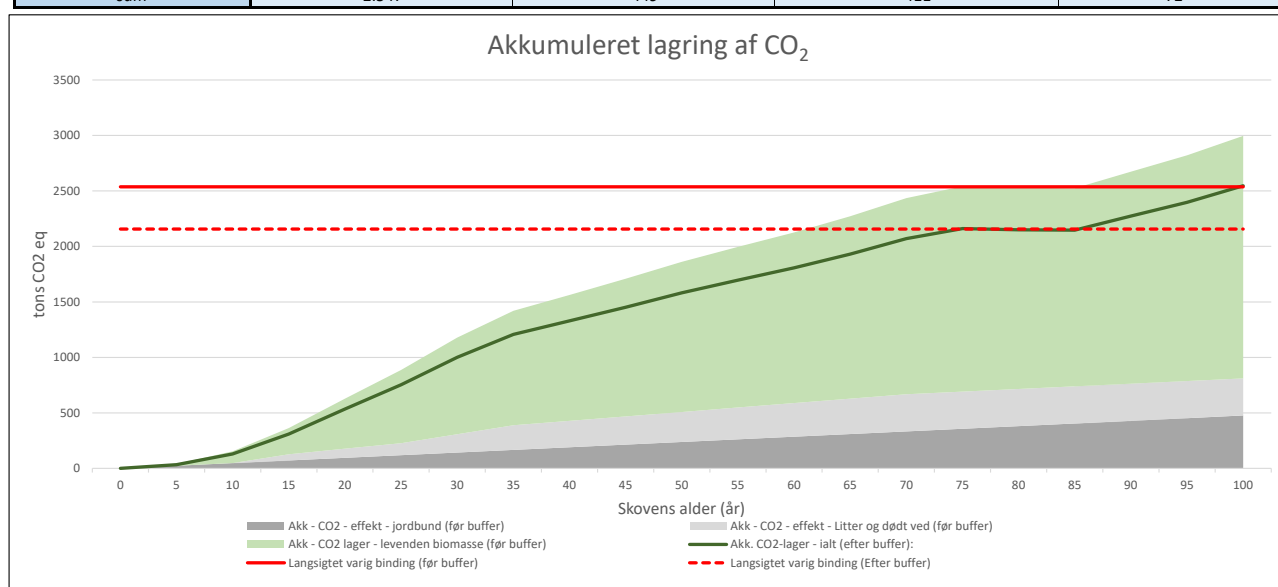

Rettigheder til projektets CO2-enheder

Klimaskovfonden har rettighederne til at formidle og definere anvendelsen af CO2-enheder, herunder sælge CO2-enhederne fra projektet. Lodsejere kan ikke videresælge CO2-enhederne eller videreformidle effekten til tredjepart.

Ved CO2-enheder menes den samlede mængde CO2, opgjort i tons CO2-ækvivalenter, der på baggrund af klimaskovfondens beregningsmodel, forventes bundet i skoven igennem projektperioden, og som klimaskovfonden har rettighederne til at sælge. Med CO2-effekt forstås den samlede og overordnet CO2 binding projektet vil bidrage med.

- ✓ Jeg bekræfter, at Klimaskovfonden har rettighederne til at formidle og definere anvendelsen af CO2-enheder, herunder sælge CO2-enhederne fra projektet. Dvs., jeg kan ikke sælge CO2-enhederne eller formidle CO2-effekten til andre.
- ✓ Jeg bekræfter, at Klimaskovfonden har ret til at optage mit projekt i fondens kommende klimaregister.
